


Piano Banda Ultra Larga Marche – Task Force

Seconda riunione 28/03/2019

1. *Aggiornamento dello stato di avanzamento del Piano BUL nazionale*
2. *Aggiornamento dello stato di avanzamento del Piano BUL Marche*
3. *Rilevazione di proposte di attività, richieste di approfondimenti e disponibilità offerte dai componenti della Task Force*
4. *Approfondimenti richiesti*
5. *Presentazione della «Newsletter TF BUL Marche»*
6. *Prossimi passi*



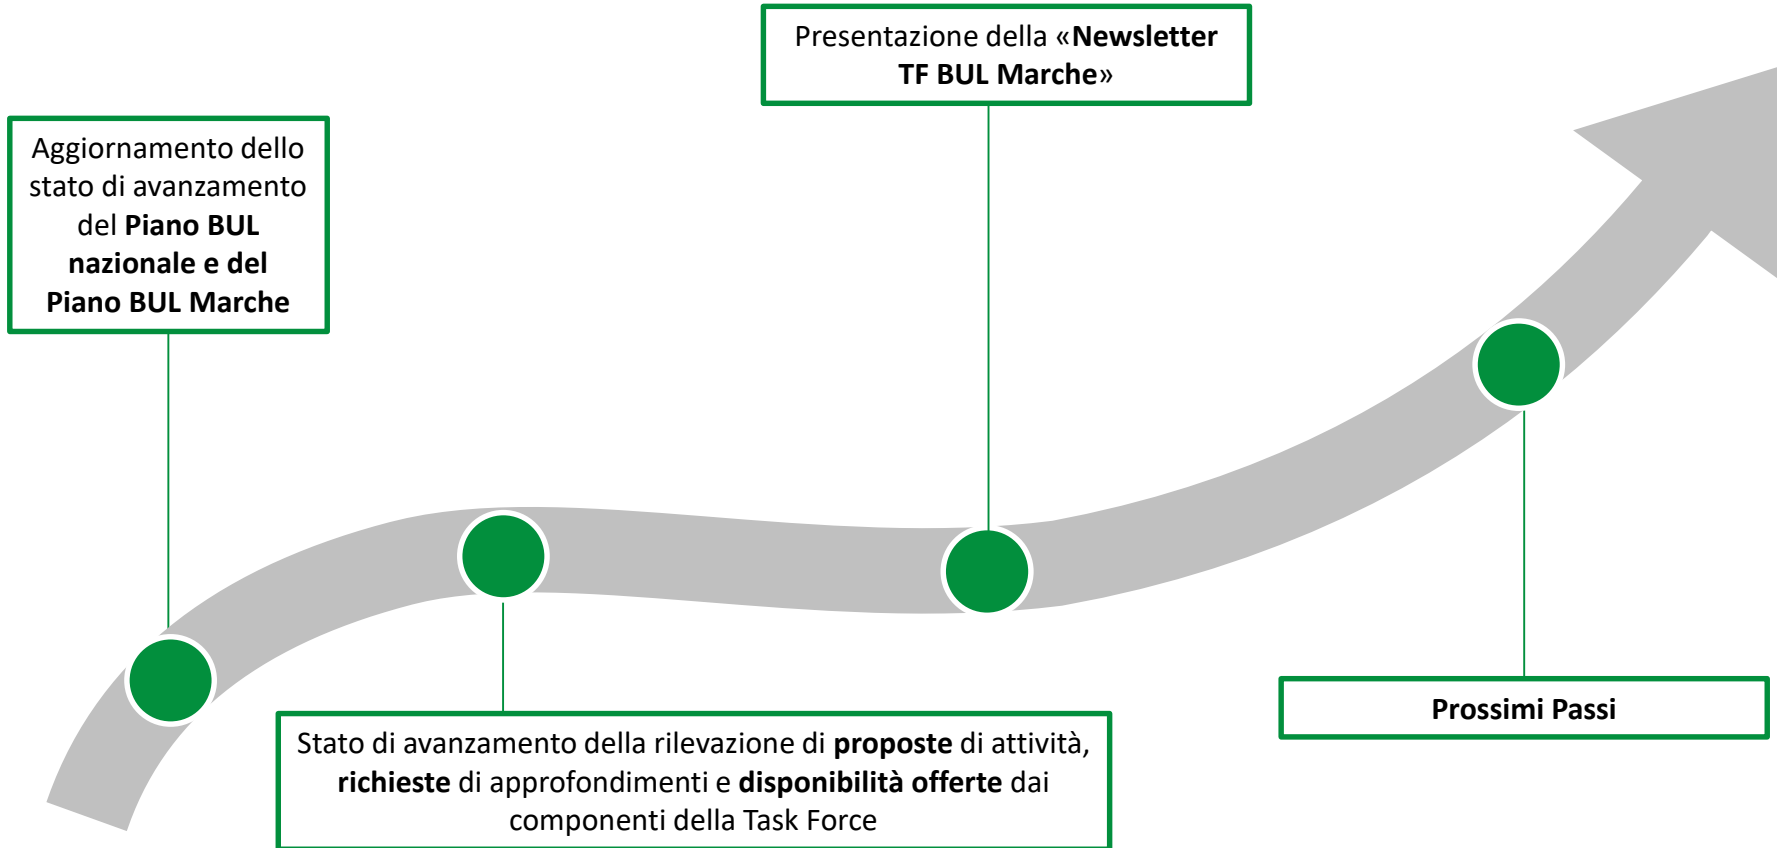


1) Avanzamento del Piano BUL Italia - 1/3

Le convenzioni

Stato convenzioni Infratel-Comuni

% Comuni che hanno firmato la convenzione

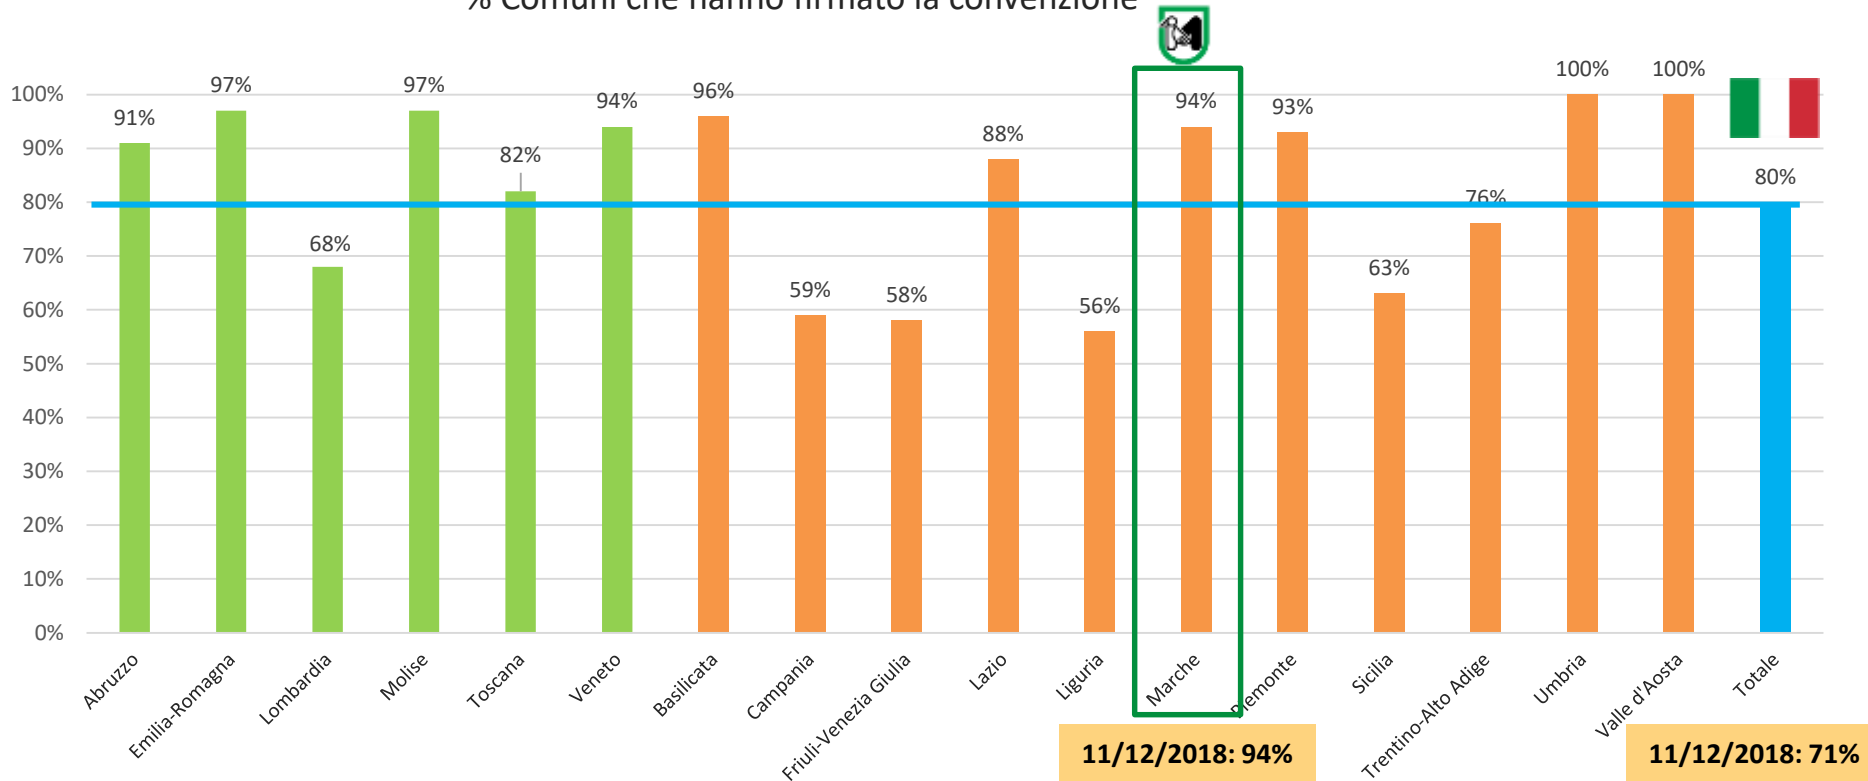


Le Marche sono tra le regioni dove il processo di firma delle convenzioni con i Comuni è più avanti

Dato al 04/03/2019 5

1) Avanzamento del Piano BUL Italia - 2/3

La progettazione (progetti Fibra Ottica)

Stato dei Progetti Fibra Ottica

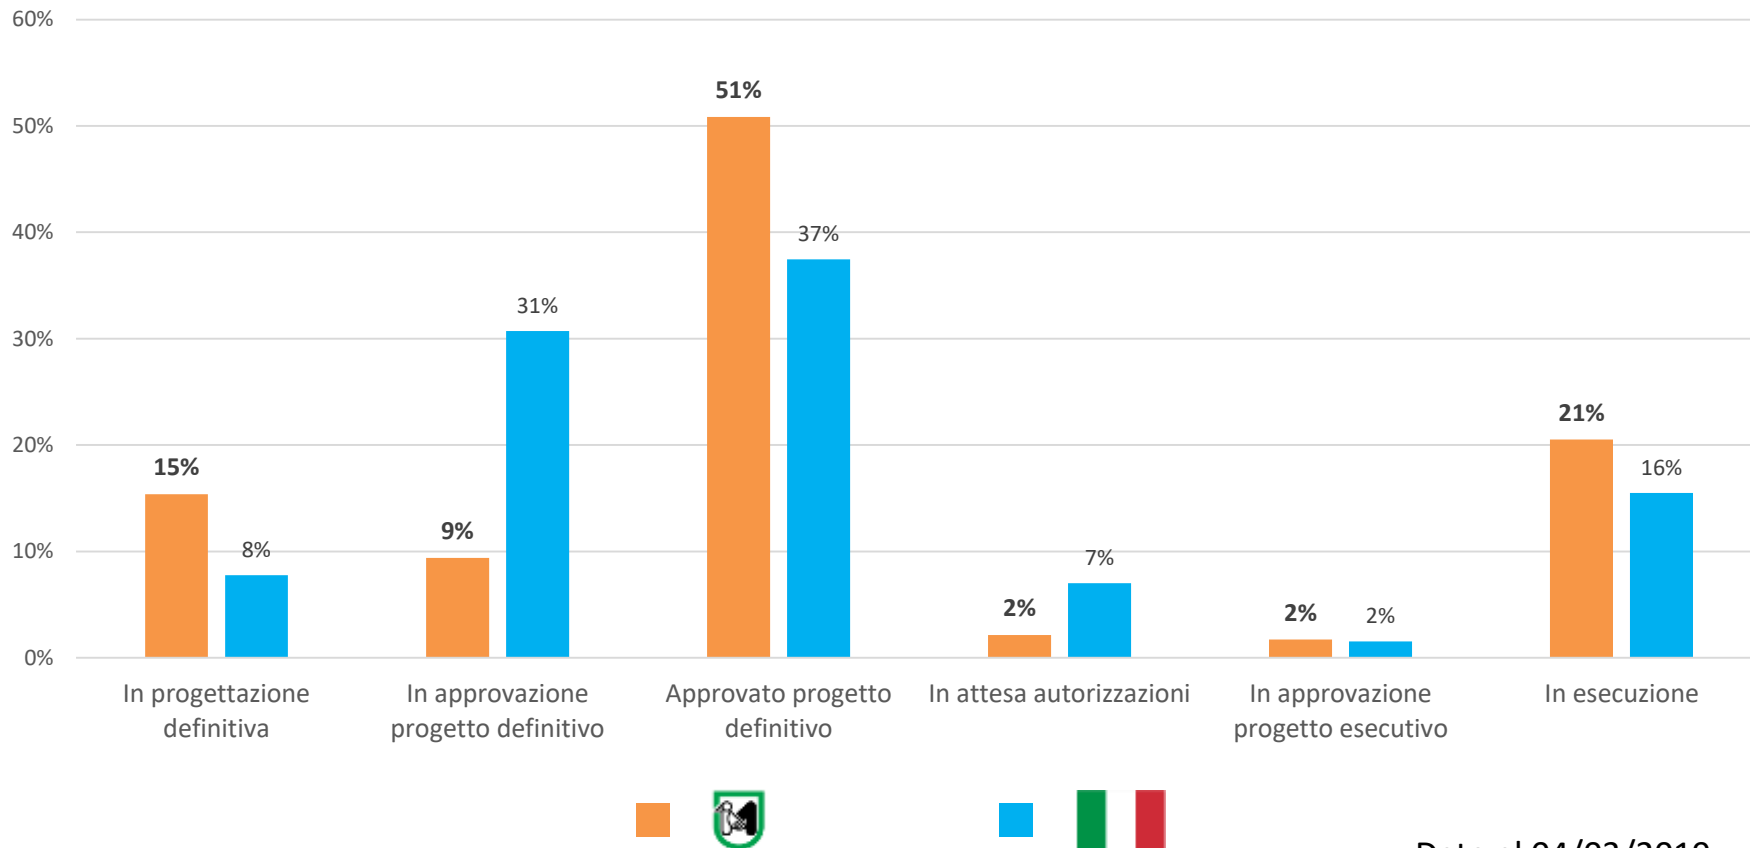


1) Avanzamento del Piano BUL Italia – 3/3 I cantieri

Stato dei Cantieri - Fibra Ottica

Cantieri in esecuzione Fibra



Cantieri in esecuzione FWA

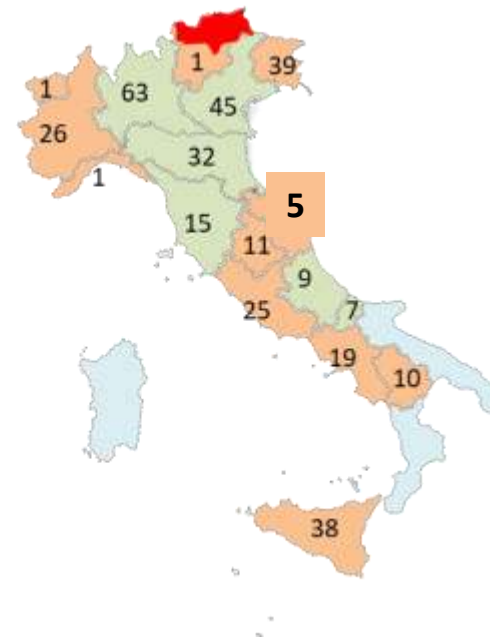


CANTIERI IN ESECUZIONE = 1043 (FIBRA) + 316(FWA)

Dato al 04/03/2019 7

2) Avanzamento Piano BUL Marche – Le convenzioni

Stato avanzamento convenzioni

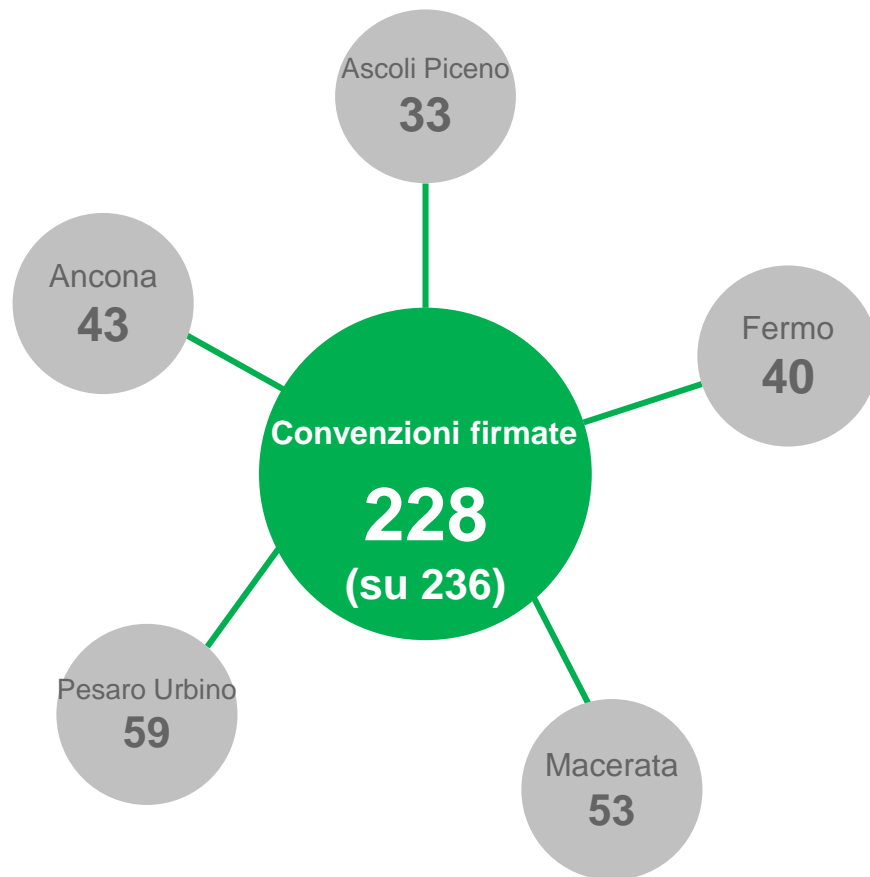


Comuni che non hanno ancora firmato la convenzione

Ancona (AN)	Fase 4
Camerano (AN)	Fase 4
Castellbellino (AN)	Fase 4
Chiaravalle (AN)	Fase 4
Macerata (MC)	Fase 4
Potenza Picena (MC)	Fase 4
Pioraco (MC)	Fase 2
Civitanova Marche (MC)	Fase 3

2) Avanzamento Piano BUL Marche – La Progettazione

Stato avanzamento progetti: Progetti Definitivi Concessionario Approvati

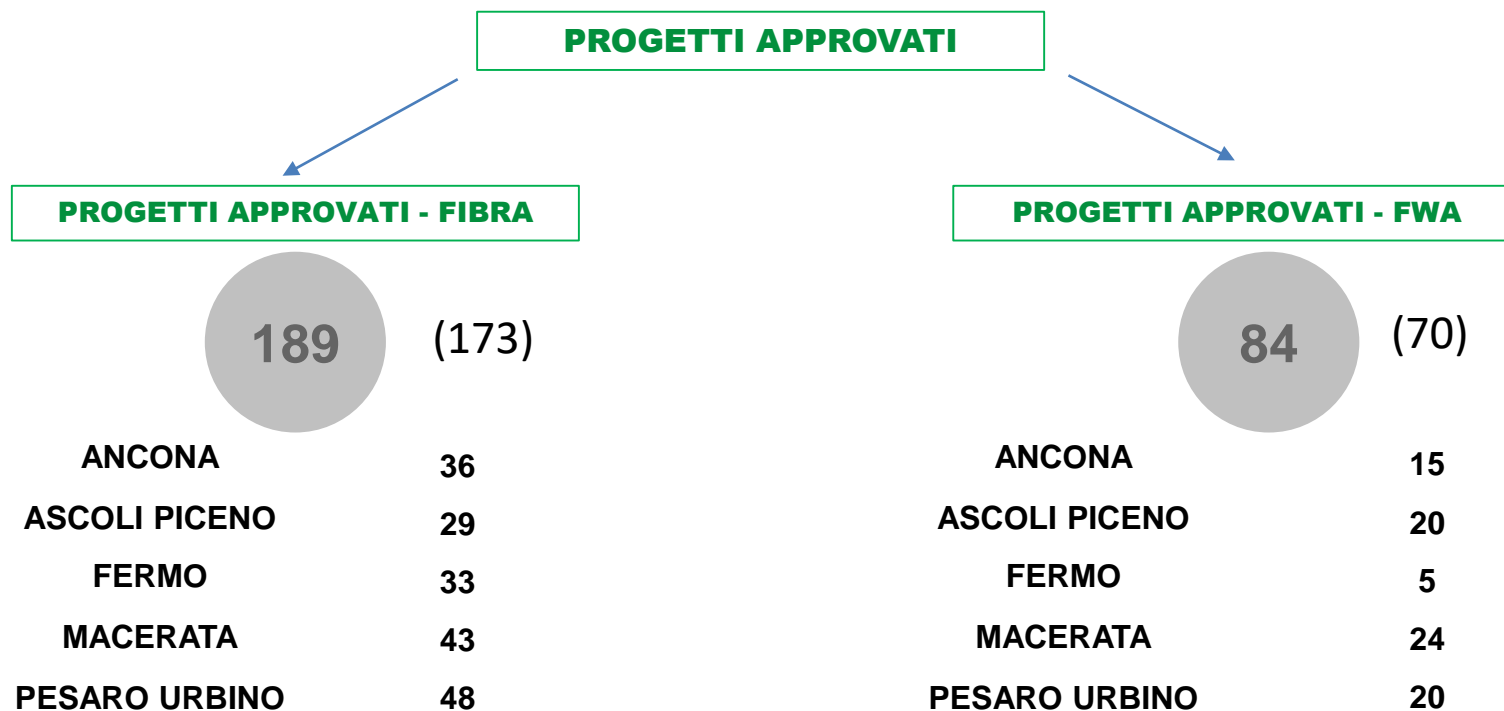

2) Avanzamento Piano BUL Marche – I permessi

Stato avanzamento permessi

DETTAGLIO PERMESSI

PERMESSI RICHIESTI-TRATTE

1392 (1.217)

PERMESSI OTTENUTI-TRATTE

406 (349)

CANTIERI APERTI-COMUNI

46 (45)

	PERMESSI RICHIESTI-TRATTE	PERMESSI OTTENUTI-TRATTE	CANTIERI APERTI-COMUNI
ANCONA	170	46	3
ASCOLI PICENO	273	84	11
FERMO	164	33	7
MACERATA	222	77	8
PESARO URBINO	563	166	17

2) Avanzamento Piano BUL Marche – I cantieri

Stato avanzamento cantieri

CANTIERI APERTI

CANTIERI APERTI - FIBRA

41

2

11

5

7

16

46

ANCONA

ASCOLI PICENO

FERMO

MACERATA

PESARO URBINO

CANTIERI APERTI - FWA

5

1

0

2

1

1

UNITA IMMOBILIARI INTERESSATE

55.985

ANCONA

4.430

ASCOLI PICENO

15.119

FERMO

9.129

MACERATA

3.923

PESARO URBINO

23.384

2) Avanzamento Piano BUL Marche – Il piano


Numero Comuni per periodo di avvio

	Piano 2018	In avvio H1 2019	In avvio H2 2019	Avvio 2020	Sospeso	Totale
AN	2	9	13	21	2	47
AP	11	5	11	2	4	33
FM	5	3	6	22	4	40
MC	7	12	16	18	2	55
PU	16	8	17	16	2	59
Totale complessivo	41	38	63	79	14	234+2

**141 Comuni in cui si prevede l'attivazione del servizio
wholesale entro la fine del 2019**

2) Avanzamento Piano BUL Marche – Le Conferenze di Servizi 1/2

Pianificazione Conferenze di Servizi al 28/03/2019

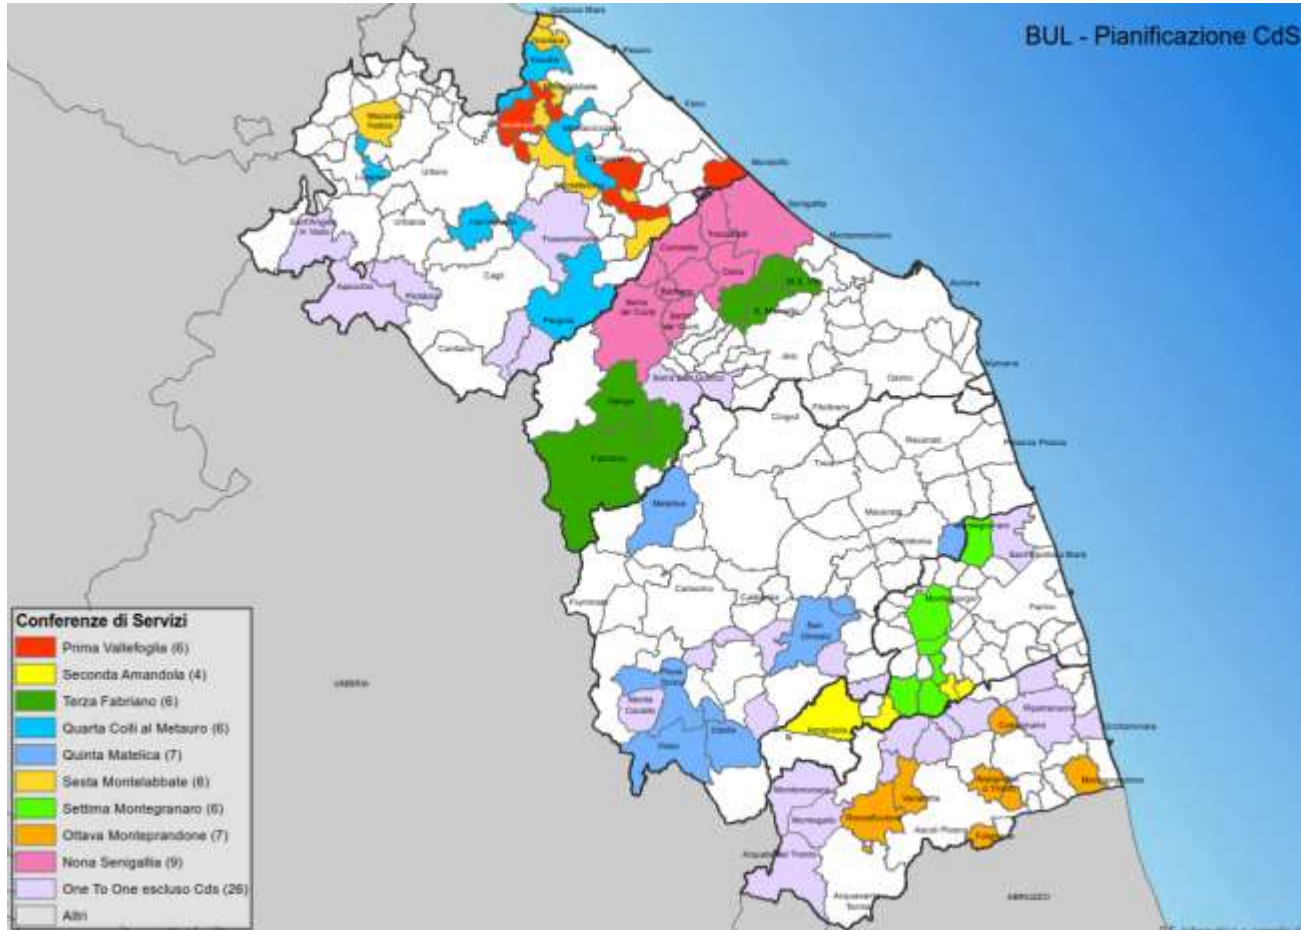

2) Avanzamento Piano BUL Marche – Le Conferenze di Servizi 2/2

Stato avanzamento Conferenze di Servizi

CONCLUSA

CdS 2 (Amandola) - COMUNI: AMANDOLA, ORTEZZANO, MONTE RINALDO, MONTEFALCONE APPENNINO.

CdS 1 (Vallefoglia) - VALLEFOGLIA, MONDOLFO, PETRIANO, TERRE ROVERESCHE per l'ex Municipalità di Orciano di Pesaro, Colli al Metauro per l'ex Municipalità di Saltara e Montemaggiore al Metauro;

IN CORSO

CdS 5 (MATELICA) – COMUNI: MATELICA, PIEVE TORINA, USSITA, VISSO, SAN GINESIO, RIPE SAN GINESIO, MONTE SAN GIUSTO

CdS 3 (FABRIANO) – COMUNI: FABRIANO, SAN MARCELLO, BELVEDERE OSTRENSE, GENGA, MONTE SAN VITO, MORRO D'ALBA.

CdS 4 (COLLI AL METAURO) – COMUNI: COLLI AL METAURO per l'ex. Municipalità di Serrungarina, Fermignano, Monteciccardo, Fermignano, Monteciccardo, Tavullia, Pergola, Lunano.

PROGRAMMATA

CdS 6 – COMUNI:
GABICCE MARE,
MONDAVIO, GRADARA,
MOTEFELCINO,
MACERATA FELTRIA,
MONTELABBATE
STATO: PREISTRUTTORIA
EFFETTUATA IL 15/3/2019

CdS 7 – COMUNI: MONTEPARO, MONTEGRANARO,
MONTEGIORGIO, SANTA VITTORIA IN MATENANO,
BELMONTE PICENO, MONSAMPIETRO MORICO
STATO: PREISTRUTTORIA PROGRAMMATA PER IL 4/4/2019

CdS8 – COMUNI: COSSIGNANO, CASTEL DI LAMA,
FOLIGNANO, ROCCAFLUVIONE, APPIGNANO DEL TRONTO,
MONTEPRANDONE, VENAROTTA
STATO: PREISTRUTTORIA PROGRAMMATA PER IL 9/4/2019

CdS 9 – COMUNI: ARCEVIA,
BARBARA, CASTELLONE DI
SAUSA, CORINALDO,
OSTRAVETERE, SERRA DEI
CONTI, OSTRA, TRECATELLI,
SENIGALLIA
STATO: PREISTRUTTORIA
PROGRAMMATA PER IL 18/4/2019

3 domande

1

Le proposte di ulteriori attività della Task Force, di ulteriori modalità di comunicazione all'interno e verso l'esterno, di temi da aggiungere, ecc.

2

Le iniziative delle diverse organizzazioni partecipanti sul tema della BUL e del Digitale che possono essere messe a fattor comune (esempi)

3a

Per gli enti: come identificare le aree produttive da raggiungere con la rete BUL e come mettere a fattor comune le informazioni ed i dati delle imprese

3b

Per gli operatori TLC: quali sono le informazioni e i dati di cui hanno bisogno per programmare gli investimenti nelle aree bianche (in termini sia di disponibilità delle reti, sia di domanda potenziale)

**Si raccomanda di compilare il questionario inviato e rimandarlo a:
attuazione.bandaultralarga@regione.marche.it**

Enti/Operatori che hanno risposto al questionario: CNA Marche, Uniontrasporti, Confartigianato MC/Fidoka, Confartigianato Marche, Fastweb, Vodafone, Mobilia, Newtec, Wispone, Euro.net

1

Proposte: mappa interattiva della rete e della domanda, comunicazione di info all'offerta sulla domanda.

Focus su: incentivi alla domanda, listini uso infrastrutture e listino promozionale, normativa utilizzo infrastrutture esistenti, pianificazione BUL rispetto alla rete mobile, imprese di servizi diffuse sul territorio

2

Iniziative da mettere in comune: Seminari su temi ICT, report sulle economie locali, esperienze nelle sperimentazioni OF in aree bianche e Digital Innovation Hub

3a

Info su aree produttive: report camerali per Comune, osservatorio esigenze BUL delle PMI


3b

Info per investimenti:

3b1 – disponibilità della rete: mappature rete BUL, punti di interscambio, tempi di disponibilità delle infrastrutture

3b2 – domanda potenziale: info dettagliate sulle aziende e sui potenziali sottoscrittori

4) Approfondimenti richiesti nella prima riunione



4) Rilevazione tematiche - Mappatura aree produttive

Le aree produttive sono un aspetto cruciale dell'attività della Task Force.

Il Piano BUL deve assicurare:

- 1. che siano identificate in sede di progettazione tutte le aree produttive**
- 2. che vi siano le condizioni affinché il servizio sia effettivamente erogato dagli operatori di telecomunicazioni**

1

Come identificare le aree produttive? (Piani regolatori comunali, informazioni camerali, informazioni associative, ecc.)

IDENTIFICARLE

2

Quali dati possono essere rilevanti sulle imprese nelle aree bianche e sullo domanda potenziale di banda ultralarga?

QUALIFICARLE


3

In che modo far conoscere agli operatori le informazioni sulla rete e sulla domanda potenziale delle imprese?

RAPPRESENTARLE

5) La Newsletter della Task Force BUL Marche

La struttura: 4 sezioni principali

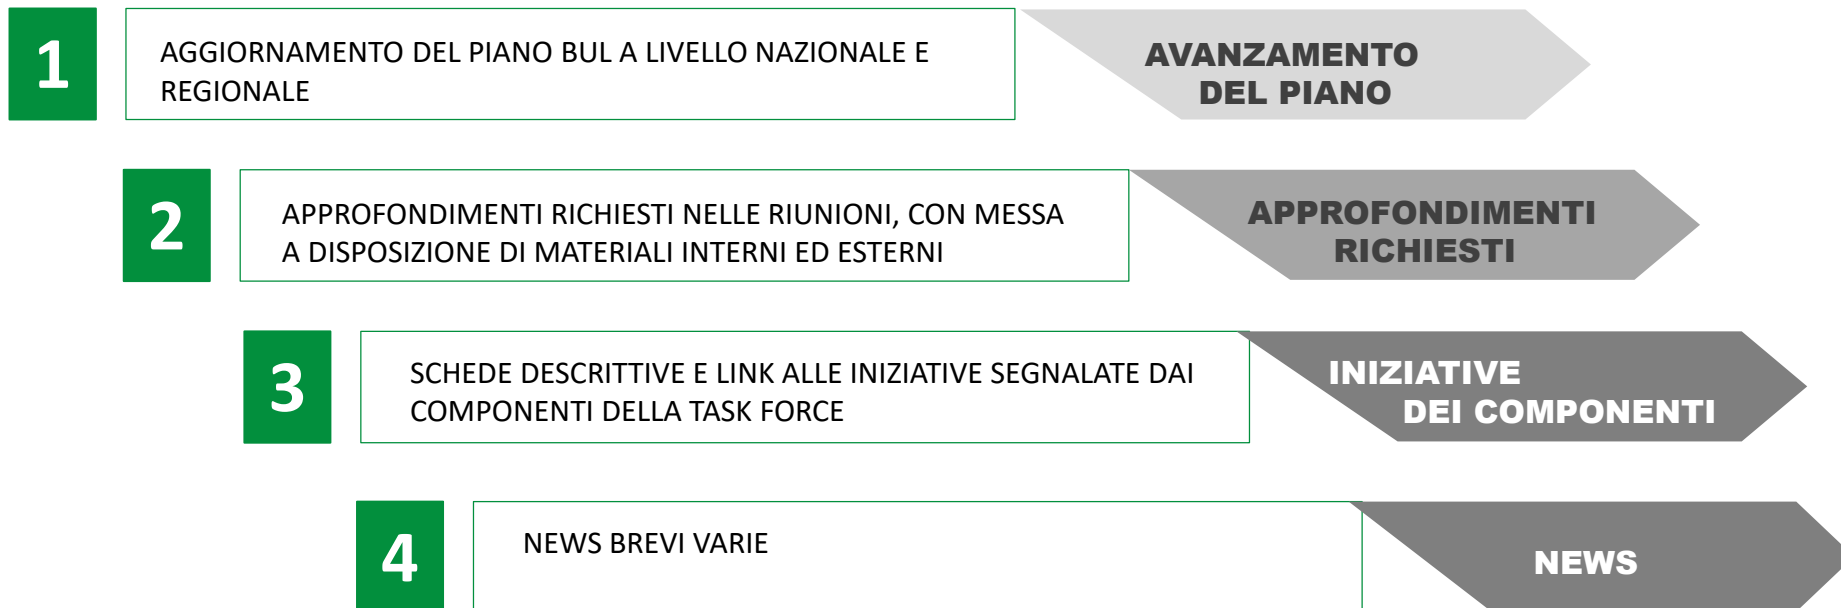

Pianificazione riunioni

Prossime riunione:

Riunione operativa: prima settimana di Maggio

Riunione strategica: inizio giugno

Contenuto riunione

Aggiornamento Piano BUL

Illustrazioni iniziative dei componenti TF

Approfondimenti richiesti
