

# Banda Ultra Larga Regione Marche




## Piano BUL Marche per lo sviluppo della banda ultra larga nei territori marchigiani

Con l'obiettivo di rendere il territorio più intelligente, migliorare la qualità della vita e contribuire allo sviluppo di politiche di innovazione sul territorio, a partire dalle infrastrutture digitali di nuova generazione, la Regione Marche, in linea con la **Strategia nazionale per la banda ultra larga** e con gli obiettivi **dell'Agenda Digitale Europea**, ha approvato con DGR n. 251 del 25/03/2016 il nuovo **Piano telematico regionale per lo sviluppo della banda ultra larga nel territorio marchigiano** che è stato definitivamente approvato dall'Assemblea Consiliare Marche con **Delibera Amministrativa n.31 il 2/08/2016**.

In attuazione dell'Accordo Quadro per lo sviluppo della Banda Ultra Larga stipulato nell'ambito della Conferenza stato-Regioni l'11 febbraio 2016, è stato stipulato tra Regione Marche e Ministero dello Sviluppo Economico in data 01/08/2016 un **Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra larga nel territorio della Regione Marche** (Reg. Int. 2016/256), approvato con DGR n. 898/2016.

**Finanziamenti Totale = 105.477.639,00 €**

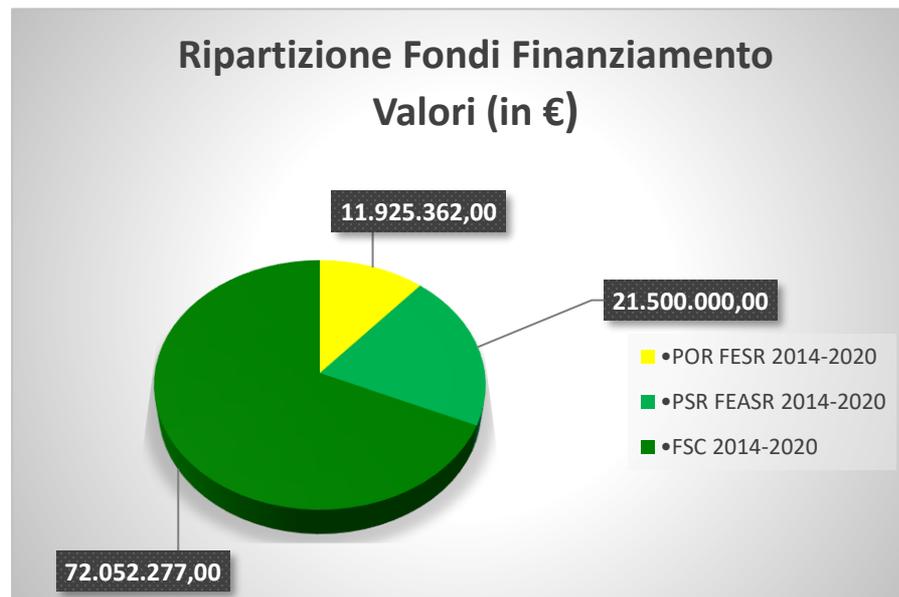


- La gara relativa ai lavori per l'infrastruttura in fibra ottica di proprietà pubblica tramite il soggetto attuatore, Infratel Italia (società in house del MISE) che consente l'erogazione dei servizi di accesso a 30 e 100 Mbits è stata aggiudicata alla ditta **OPEN FIBER** ed il relativo **contratto** è stato stipulato in data **09/11/2017**.
- Allo scopo di coinvolgere il territorio nella fase attuativa degli interventi sono stati organizzati diversi incontri operativi con la presenza dei responsabili della gara per la progettazione, realizzazione e gestione in concessione delle infrastrutture in fibra ottica, della ditta aggiudicataria, dei Comuni interessati, delle Province e delle Sovrintendenze.
- I **Comuni** sono stati supportati dalla Regione nella sottoscrizione della **Convenzione Operativa** con **Infratel Italia Spa**, attraverso specifiche indicazioni e modulistica ad hoc.
- Ad oggi, tutti i 236 comuni hanno sottoscritto la Convenzione con Infratel.

PROV	Stima Valore Opere €	Stima Prezzo €
AN	23.338.798,50	10.493.878,98
AP	14.689.225,27	6.604.750,98
FM	13.380.280,67	6.016.207,14
MC	29.168.955,80	14.930.262,79
PU	25.166.018,92	11.315.456,40
<b>TOT</b>	<b>105.743.279,16</b>	<b>49.360.556,28</b>

La Regione ha assunto il ruolo di soggetto **“facilitatore”**, oltre che di **finanziatore**, svolgendo azioni di raccordo organizzativo, e di supporto informatico ed amministrativo verso i comuni del territorio regionale e gli altri attori coinvolti.

Ha inoltre coadiuvato i comuni capofila e gli enti partecipanti nelle fasi di indizione e conduzione delle **30 Conferenze di Servizi** Decisorie gestite con la piattaforma telematica regionale **MeetPAD**, per un totale di 216 progetti autorizzati.

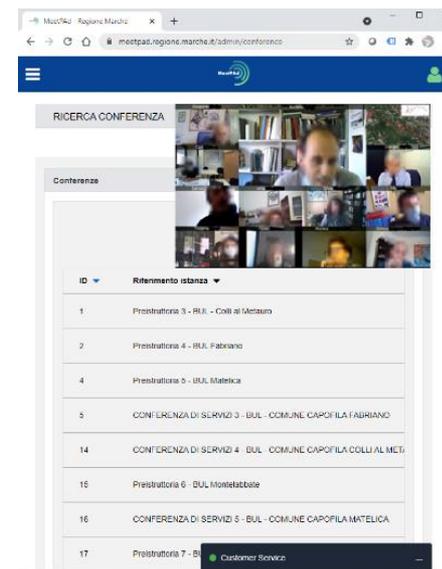


La Regione Marche ha istituito con delibera la **Task Force** degli operatori, con la funzione di **“cerniera”** con i soggetti del territorio marchigiano, accelerare la realizzazione del Piano, favorire la cultura del digitale e la diffusione delle connessioni veloci alla rete presso i cittadini, le imprese e le amministrazioni marchigiane; è composta dai seguenti soggetti: Confindustria, Confartigianato, CNA Marche, ANCI Marche, Uniontrasporti, ANCI Nazionale, Lega delle Autonomie, Corecom, Università, Operatori di telecomunicazioni.

## Le principali cause che hanno determinato il ritardo nell'esecuzione delle opere:

- complessità dei procedimenti amministrativi, molti pareri/nulla osta da acquisire
- difficoltà spesso verificatesi nell'individuare aree comunali da concedere per la realizzazione dei PCN (cabine shelter)
- aree ad alto rischio archeologico, che hanno comportato spesso operazioni più lunghe di scavo
- bonifiche palifiche altri operatori (enel distribuzione) con tempi lunghi di esecuzione di tali operazioni e successive operazioni di posa fibra sulle stesse
- problematiche permessi e ostruzionismo privati per passaggio fibra su palifiche esistenti di Enel Distribuzione
- emergenza COVID con sospensioni cantieri nella prima parte dell'anno 2020
- difficoltà da parte della concessionaria nel reperire maestranze per lavorazioni altamente specializzate

## Le principali azioni messe in campo da Regione Marche ed in corso per risolvere le problematiche sopraesposte:

- supporto nello svolgimento di conferenze di servizi
- **Da ottobre/2020** riunioni di monitoraggio per raggruppamenti comuni in conferenza di servizi, al fine di individuare le problematiche e criticità in corso d'opera. Le riunioni servono anche ad illustrare come poter informare la cittadinanza da parte dei Sindaci riguardo le attivazioni sui comuni collaudati.
- sinergia con Soprintendenza
- tavolo tecnico con Enel distribuzione e Openfiber per verifica soluzioni volte a ridurre le tempistiche dovute alle bonifiche palifiche Enel e successiva posa della fibra ottica

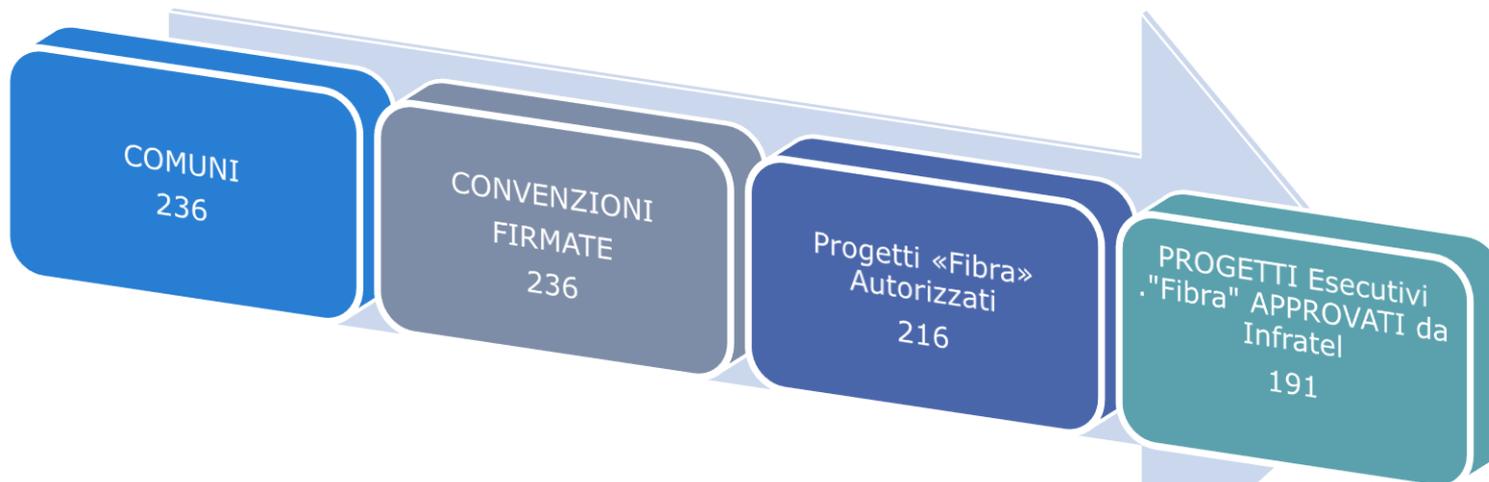


## Cantieri





## Stato previsione cantieri

### Comuni con Cantiere Aperto

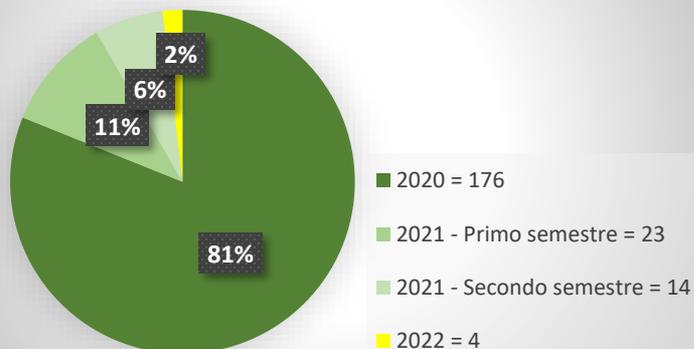

### Comuni con Cantiere Chiuso

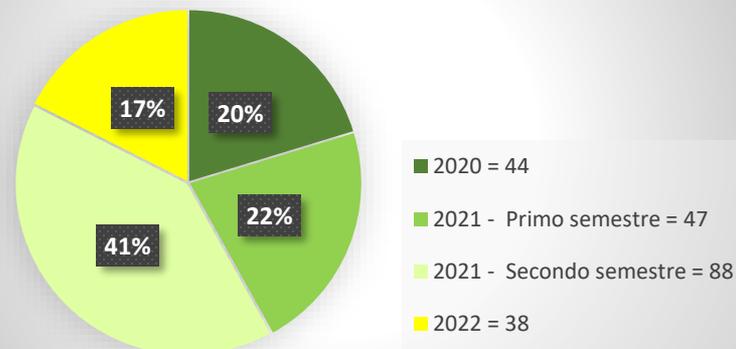



	2018	2019	2020	Previsiti fine 2021	Previsiti fine 2022
■ Cantieri chiusi da Pianificazione	0	10	34	135	38
■ Richiesta anticipazione al 2021					14

■ Cantieri chiusi da Pianificazione   ■ Richiesta anticipazione al 2021

Al 15 marzo 2021 sono state raggiunte 23.585 unità immobiliari in tecnologia FTTH


Per un ammontare di 13.929.937,32 €

Sono stati realizzati 198.694 m di nuova Infrastruttura


Sono stati utilizzati 428.070 m di Infrastruttura esistente

Per un totale di 626.764 m di Infrastruttura

## Comuni collaudati totale 37



	2018 e 2019	Dal 2020 ad oggi
Comuni collaudati	0	37

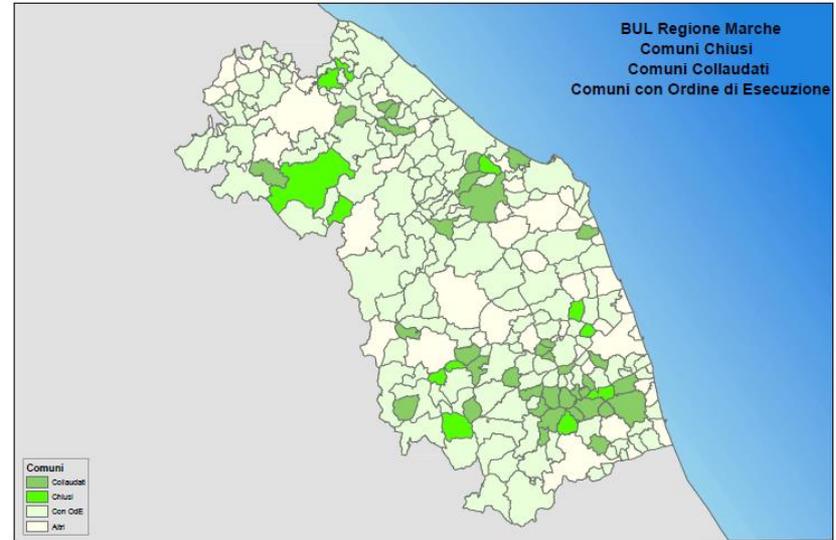


comune	provincia
Cupramontana	Ancona
Falconara Marittima	Ancona
Jesi	Ancona
Loreto	Ancona
Monte San Vito	Ancona
Morro d'Alba	Ancona
San Marcello	Ancona

comune	provincia
Appignano del Tronto	Ascoli Piceno
Carassai	Ascoli Piceno
Cossignano	Ascoli Piceno
Force	Ascoli Piceno
Montalto delle Marche	Ascoli Piceno
Montedinove	Ascoli Piceno
Montefiore dell'Aso	Ascoli Piceno
Palmiano	Ascoli Piceno
Ripatransone	Ascoli Piceno
Rotella	Ascoli Piceno

comune	provincia
Belmonte Piceno	Fermo
Massa Fermana	Fermo
Montappone	Fermo
Monte Rinaldo	Fermo
Monte Vidon Combatte	Fermo
Monte Vidon Corrado	Fermo
Montefalcone Appennino	Fermo
Montelparo	Fermo
Ortezzano	Fermo
Ponzano di Fermo	Fermo
Santa Vittoria in Matenano	Fermo
Torre San Patrizio	Fermo

comune	provincia
Bolognola	Macerata
Caldarola	Macerata
Cessapalombo	Macerata
Gualdo	Macerata
Monte Cavallo	Macerata
Monte San Giusto	Macerata
Monte San Martino	Macerata
Pievebovigliana	Macerata
Pioraco	Macerata
Ussita	Macerata

comune	provincia
Cagli	Pesaro e Urbino
Isola del Piano	Pesaro e Urbino
Montemaggiore al Metauro	Pesaro e Urbino
Orciano di Pesaro	Pesaro e Urbino
Piobbico	Pesaro e Urbino
Saltara	Pesaro e Urbino
Serra Sant'Abbondio	Pesaro e Urbino
Vallefoglia	Pesaro e Urbino

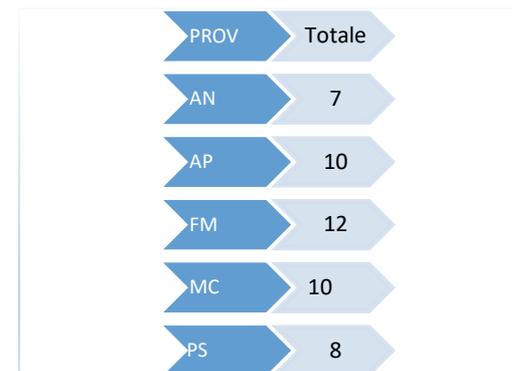


comune	provincia
Cupramontana	Ancona
Falconara Marittima	Ancona
Jesi	Ancona
Loreto	Ancona
Morro d'Alba	Ancona
San Marcello	Ancona

comune	provincia
Appignano del Tronto	Ascoli Piceno
Cossignano	Ascoli Piceno
Force	Ascoli Piceno
Montalto delle Marche	Ascoli Piceno
Montedinove	Ascoli Piceno
Montefiore dell'Aso	Ascoli Piceno
Palmiano	Ascoli Piceno
Ripatransone	Ascoli Piceno

comune	provincia
Belmonte Piceno	Fermo
Massa Fermata	Fermo
Montappone	Fermo
Monte Rinaldo	Fermo
Monte Vidon Combatte	Fermo
Monte Vidon Corrado	Fermo
Montefalcone Appennino	Fermo
Montelparo	Fermo
Ortezzano	Fermo
Ponzano di Fermo	Fermo
Santa Vittoria in Matenano	Fermo

comune	provincia
Bolognola	Macerata
Caldarola	Macerata
Cessapalombo	Macerata
Gualdo	Macerata
Monte Cavallo	Macerata
Monte San Martino	Macerata
Pioraco	Macerata

comune	provincia
Isola del Piano	Pesaro e Urbino
Montemaggiore al Metauro	Pesaro e Urbino
Orciano di Pesaro	Pesaro e Urbino
Piobbico	Pesaro e Urbino
Saltara	Pesaro e Urbino

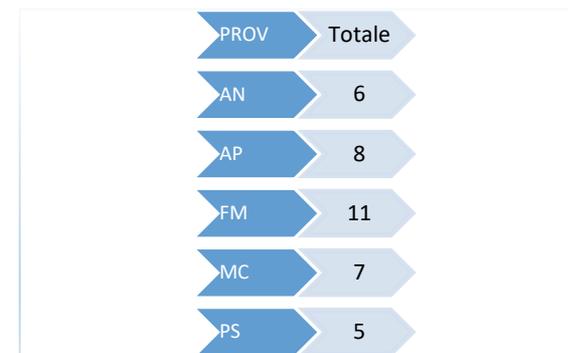


Comune	Provincia
Montalto delle Marche	Ascoli Piceno
Montedinove	Ascoli Piceno
Cossignano	Ascoli Piceno
Monte Rinaldo	Fermo
Ortezzano	Fermo
Colli al Metauro	Pesaro e Urbino
Fratte Rosa	Pesaro e Urbino
Mondavio	Pesaro e Urbino
Sant'Ippolito	Pesaro e Urbino
Terre Roveresche	Pesaro e Urbino
Castelleone di Suasa	Ancona
Corinaldo	Ancona
Carassai	Ascoli Piceno
Force	Ascoli Piceno
Massignano	Ascoli Piceno
Montefiore dell'Aso	Ascoli Piceno
Ripatransone	Ascoli Piceno
Monsampietro Morico	Fermo
Montelparo	Fermo
Montottone	Fermo
Santa Vittoria in Matenano	Fermo
Servigiano	Fermo
Appignano del Tronto	Ascoli Piceno
Valfornace	Macerata
Palmiano	Ascoli Piceno
Montefalcone Appennino	Fermo
Bolognola	Macerata
Monte San Martino	Macerata
Monte Cavallo	Macerata
Cessapalombo	Macerata
Piobbico	Pesaro e Urbino
Comune	Provincia
San Marcello	Ancona

Comune	Provincia
Morro d'Alba	Ancona
Caldarola	Macerata
Belmonte Piceno	Fermo
Monte Vidon Combatte	Fermo
Castorano	Ascoli Piceno
Ostra	Ancona
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno
Belvedere Ostrense	Ancona
Cartoceto	Pesaro e Urbino
Castel di Lama	Ascoli Piceno
Castignano	Ascoli Piceno
Fano	Pesaro e Urbino
Maltignano	Ascoli Piceno
Monsano	Ancona
Monte San Vito	Ancona
Offida	Ascoli Piceno
Senigallia	Ancona
Cupramontana	Ancona
Ponzano di Fermo	Fermo
Pioraco	Macerata
Jesi	Ancona
Loreto	Ancona
Gualdo	Macerata
Monte Vidon Corrado	Fermo
Montappone	Fermo
Massa Fermana	Fermo
Montefelcino	Pesaro e Urbino
Isola Del Piano	Pesaro e Urbino
Serra Sant'Abbondio	Pesaro e Urbino
Ussita	Macerata
Sassoferato	Ancona
Rotella	Ascoli Piceno
Falconara Marittima	Ancona


66 Comuni  
vendibili al 15  
marzo 2021.  
(Dati riferiti sia alla fibra  
che a servizi Fwa)

- Piano Integrativo
  
- Verifica copertura aree Industriali  
(vedi esempi slide Caldarola e Cupramontana)

BUL - Imprese  
Comune di Caldarola

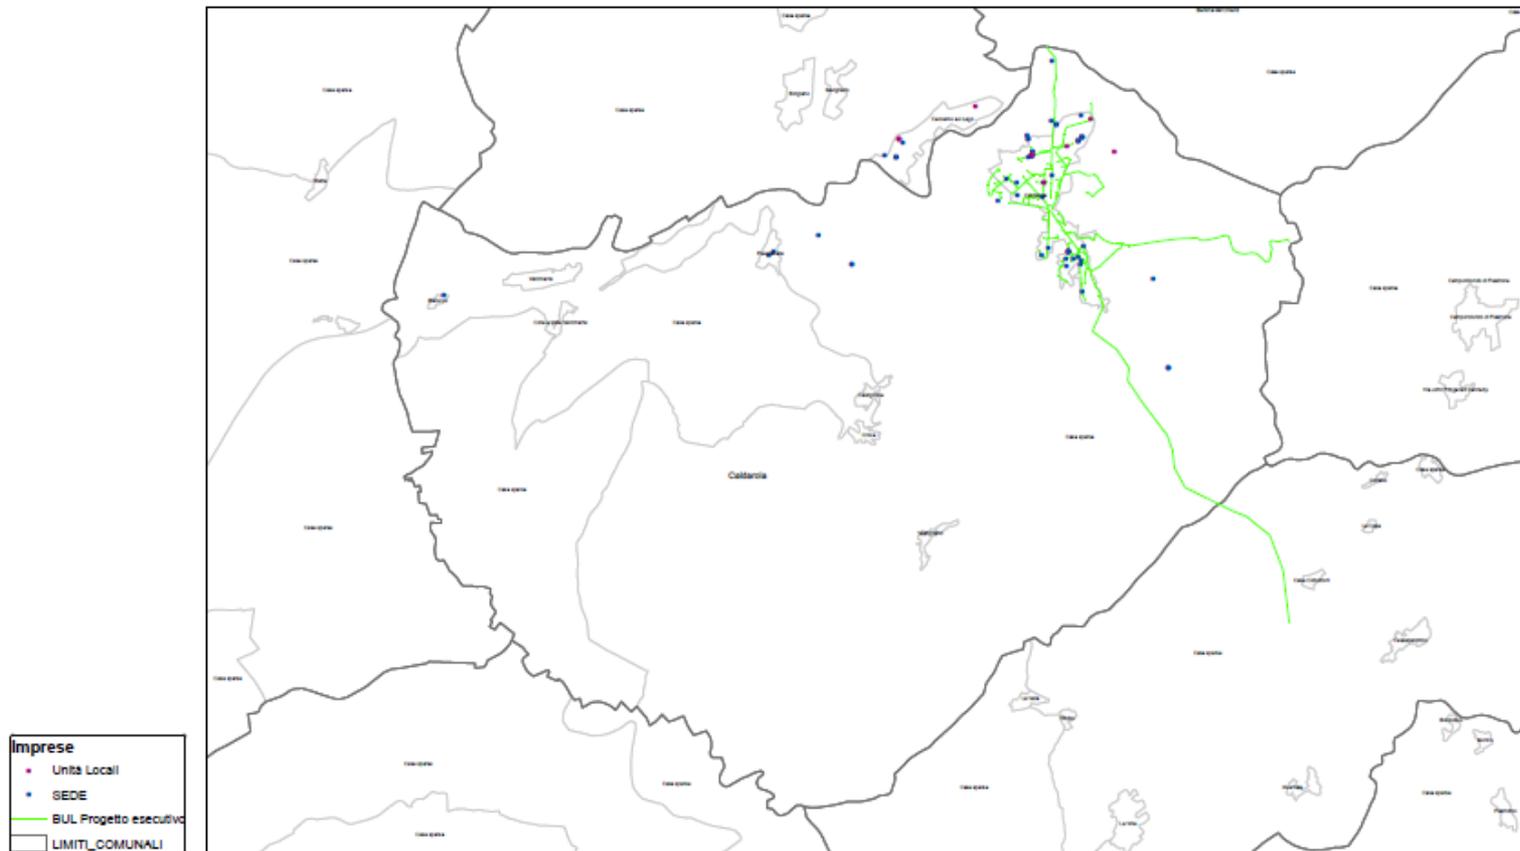

BUL - Imprese  
Comune di Cupramontana

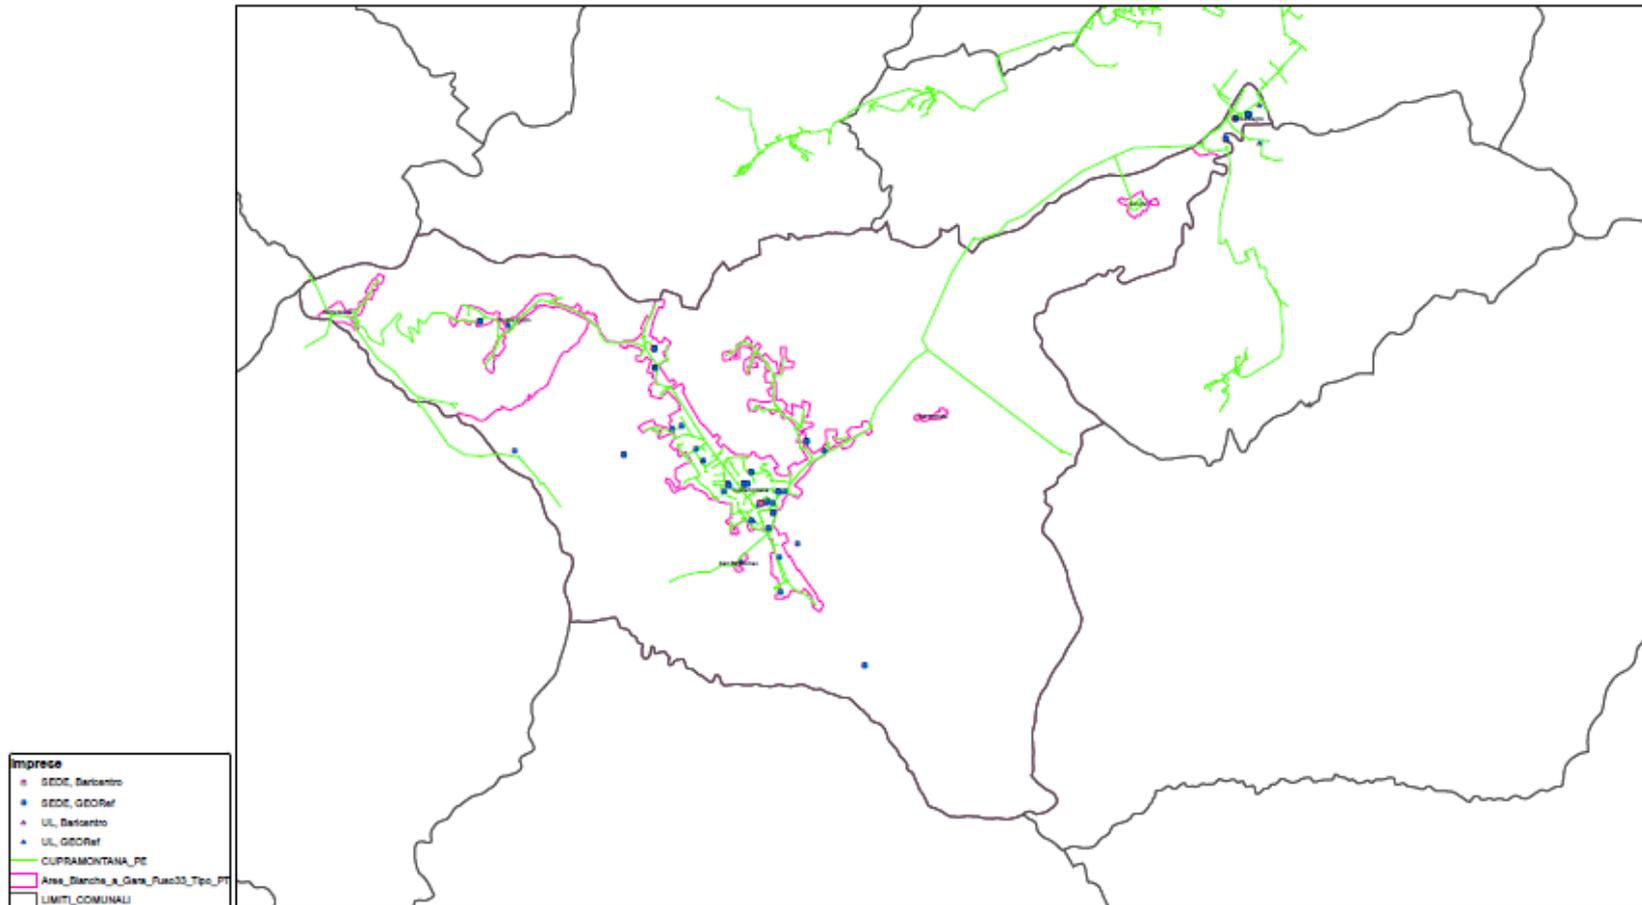



Sul sito della Regione Marche è possibile verificare se il proprio comune è raggiunto dai servizi di connessione ultraveloce (FTTH e FWA) del Piano Banda Ultra larga utilizzando il seguente link:

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Infrastrutture-per-la-Banda-Ultra-larga/Verifica-infrastrutture-BUL>

Accendo al sito Infratel <https://bandaultralarga.italia.it> è possibile verificare lo stato di avanzamento lavori del Piano Banda Ultralarga aree bianche dei comuni della regione Marche anche tramite la visualizzazione dei tracciati in fibra ottica in corso di realizzazione.

Per maggiori approfondimenti è possibile visitare direttamente il portale Open Fiber <https://www.openfiber.it/verifica-copertura>, verificando il dettaglio della copertura del servizio utilizzando indirizzo e numero civico puntuali.

Il collaudo dell'infrastruttura è già avvenuto per tutti i territori qui sotto in elenco. Alcuni progetti di implementazione della BUL risultano ancora in via di attivazione e in quei casi l'offerta di connettività da parte degli operatori di telecomunicazione sarà disponibile a breve.

Per tutti gli altri comuni collaudati e non collaudati è possibile consultare lo stato di avanzamento dei cantieri al seguente link: [Verifica Banda Ultra Larga](#)

PROV	Comune	Unità immobiliari	Data collaudo	Openfiber
AN	Cupramontana	42	30/12/2020	<a href="#">Sì</a>
AN	Falconara Marittima	536	23/02/2021	<a href="#">Sì</a>
AN	Jesi	121	12/10/2020	<a href="#">Sì</a>
AN	Loreto	394	15/12/2020	<a href="#">Sì</a>
AN	Morro d'Alba	918	09/12/2020	<a href="#">Sì</a>
AN	San Marcello	803	16/11/2020	<a href="#">Sì</a>
AP	Appignano del Tronto	706	03/03/2021	<a href="#">Sì</a>
AP	Cossignano	445	28/08/2020	<a href="#">Sì</a>
AP	Force	20	04/12/2020	<a href="#">Sì</a>
AP	Montalto delle Marche	938	13/03/2020	<a href="#">Sì</a>
		1 2 3 4		



VIA LUDOVICO CLODIO 3, CALDAROLA

Il tuo indirizzo è coperto dalla rete a banda ultra larga.

## Contatti

- Attuazione Banda Ultra Larga:  
[attuazione.bandaultralarga@regione.marche.it](mailto:attuazione.bandaultralarga@regione.marche.it)
- Sito Regione Marche BUL:  
<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Infrastrutture-telematiche-digital-divide-banda-larga-e-ultralarga>
